


# Gedimino kalno būklė



2018-08-29 Vyriausybės pasitarimas


# Gedimino kalno monitoringas

- Nuo 2018-04-19 iki 2018-08-28 **monitoringo sistema nefiksavo jokių didesnių, pavojų keliančių grunto pasislinkimų ar statinių posvyrių**. Sutvarkytose nuošliaužų vietose supilta skalda ir gruntas po ja taip pat stabilūs.
- **Ankerinių trosų**, įrengtų tarp Gedimino kalno aikštelės ir šiaurės vakarinio šlaito rostverkų, apkrova kito nežymiai.



# Gedimino kalno būklė

- Šiandien pati didžiausia rizika nuošliaužoms susiformuoti yra **Gedmino kalno rytiniame šlaite**, tarp pagrindinio tako ir Kunigaikščių rūmų. Čia jau atliekami neatidėliotini darbai.
- Lyginant su šių metų pavasariu, **Gedmino kalno vakariniame šlaite kritinė situacija suvaldyta**, tačiau čia būtina baigti įgyvendinti II etapo avarijos grėsmės pašalinimo darbus.
- **Būklės vertinimas išlieka nepakitęs. Būklė konstatuojama kaip kritinė, o situacija – kaip stabili.**
- Sutvarkius Gedmino kalno rytinius šlaitus ir įgyvendinus II etapo avarijos grėsmės pašalinimo darbus vakariniame šlaite, **tikslinga atlikti vertinimą dėl būtinybės atšaukti ekstremaliąją situaciją Gedmino kalne.**





# Rizikingiausios kalno dalys





# Stabilizuoti Gedimino kalno šlaitai



**Vakarinis šlaitas**



# Vakarinis šlaitas



# Vakarinis šlaitas





PV ir P šlaitas





PV ir P šlaitas









**PR ir R šlaitas**





**PR ir R šlaitas**





PR ir R šlaitas





**PR ir R šlaitas**






# Priemonių įgyvendinimas

- **Visos suplanuotos prevencinės ir neatidėliotinių darbų priemonės**, kurios buvo skirtos laikinai stabilizuoti nuošliaužų kūnus, **įgyvendintos**.
- **Pritaikytos inžinerinės priemonės** (molio spynos, skaldos kūgiai, sausinamieji drenažai, konstruktyviniai tinklai ir kt.) **veikia „pilnu pajėgumu“** (pvz., 2018-07-13, 2018-08-11 d. liūtys). Jų pagalba nuo nuošliaužų kūnų pašalinamas perteklinis tiek kritulių, tiek grunto vanduo ir taip sumažinama rizika tiek formotis naujoms, tiek plėstis esamos nuošliaužoms.
- Įvertinus situaciją ir galimas rizikas, **Gedimino kalnas nuo 2018-08-8 atidarytas lankymui** (uždarytas nuo 2017-11). Vakariniam bokšte įrengta nauja ekspozicija.



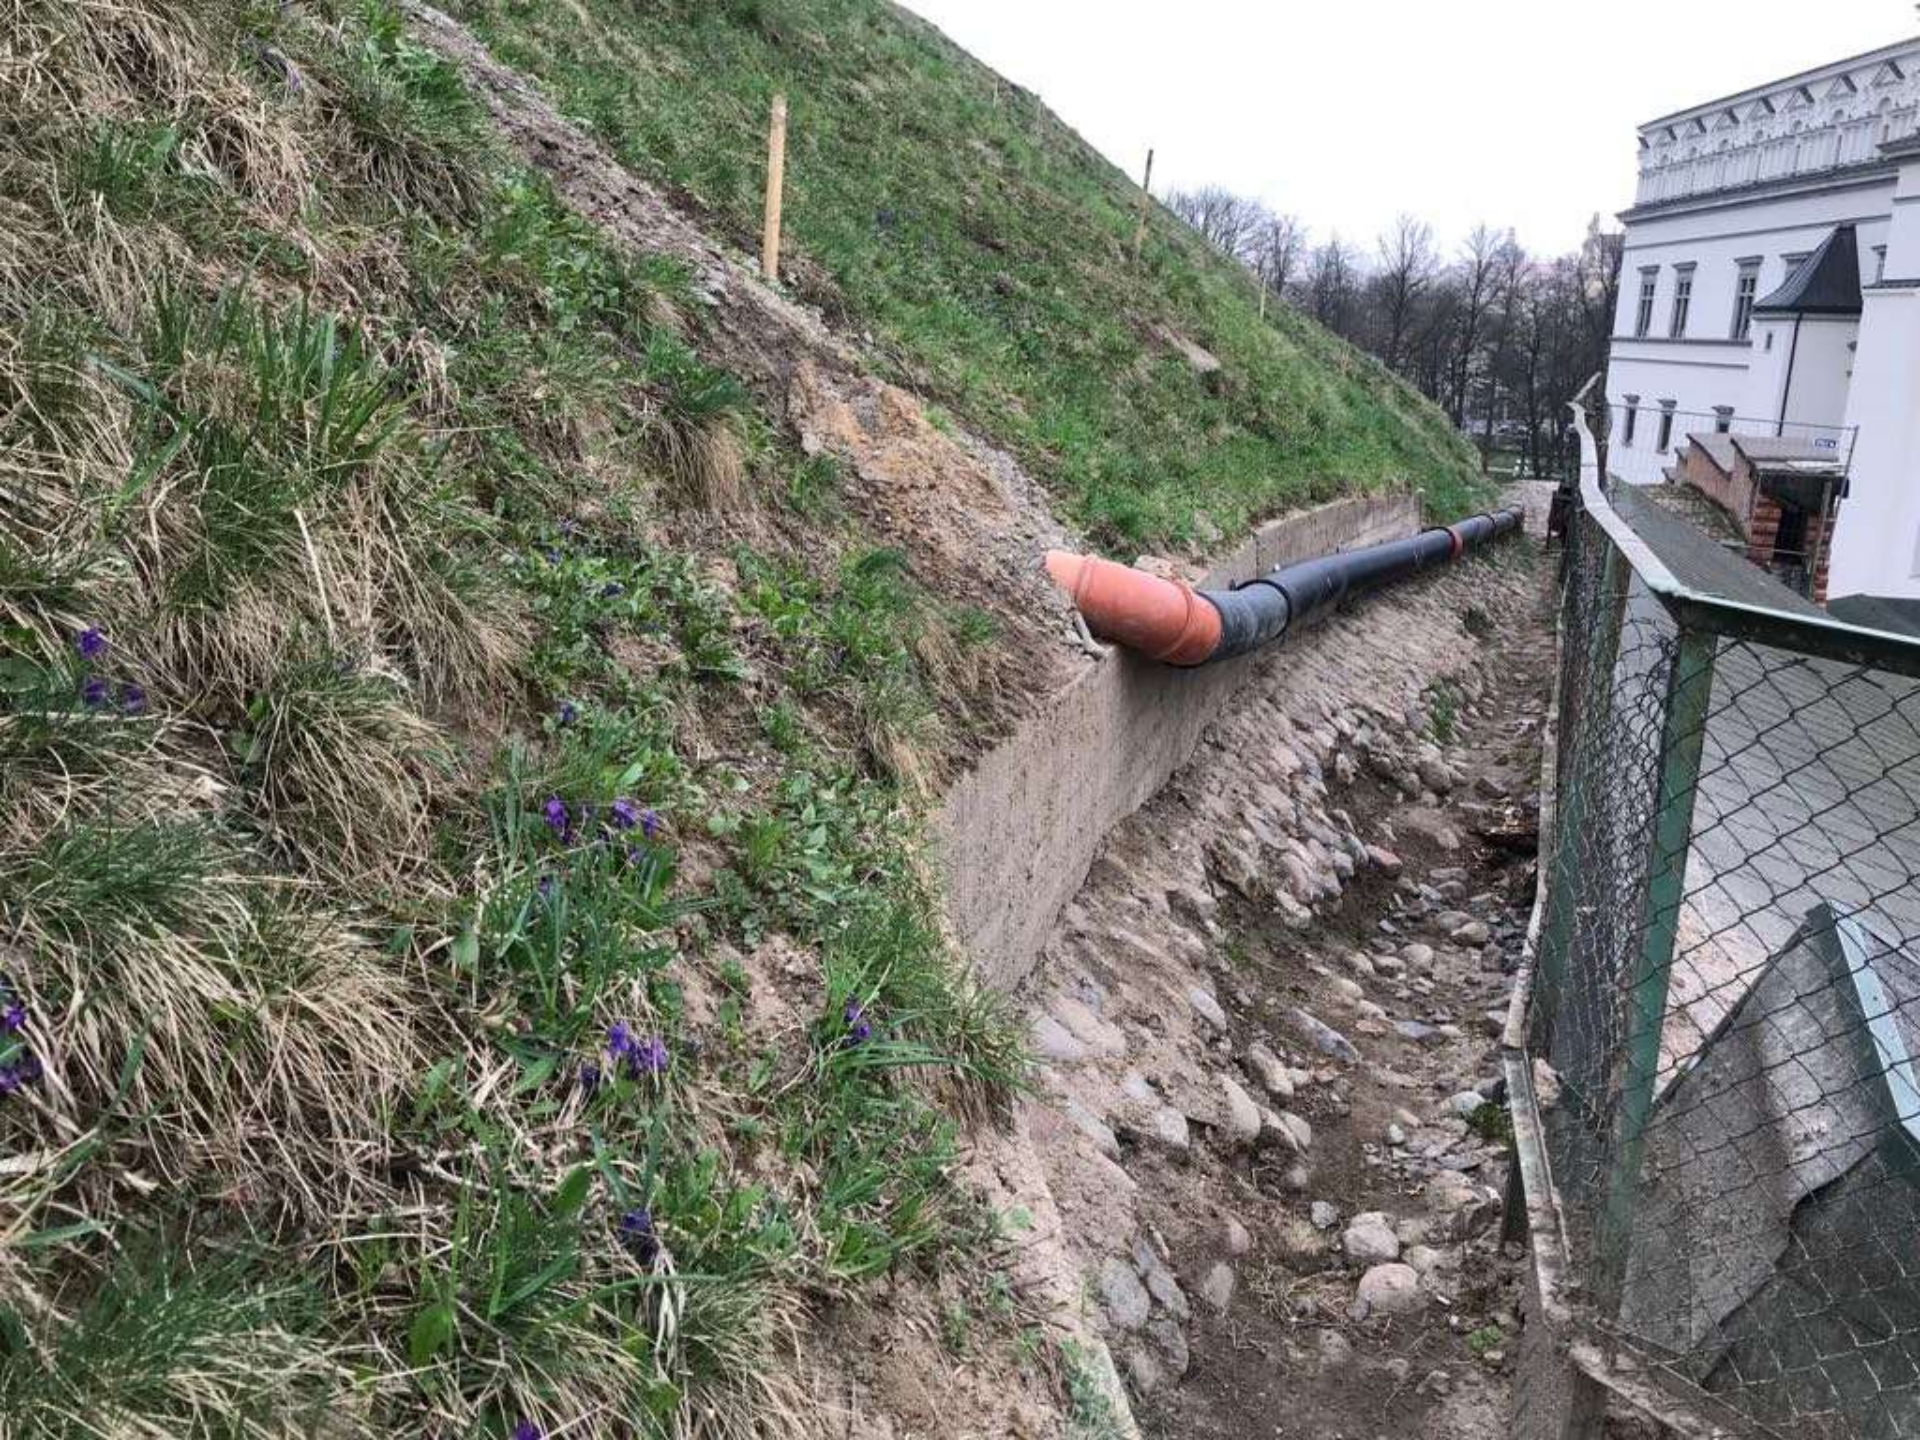











# ŠV šlaito tvarkybos darbai

- Šiaurės vakarinio šlaito tvarkybos darbai vyksta pagal darbų grafiką. **Šiandien iš esmės atlikti visi tvarkybos darbai**, liko atstatyti lauko inžinierinius tinklus ir atraminės sienos parapetą.
- **Aplinkos ministerijoje baigtas šiaurės vakarinio šlaito tvarkybos darbų investicinio projekto vertinimas** ir tikimasi, kad artimiausiu metu šis projektas bus įrašytas į ES investicijomis (05.4.1-APVA-V-016 ) finansuojamų valstybės projektų sąrašą.
- **Gedimino kalno aikštelėje baigiami ir archeologiniai tyrimai.** Jų metu aptikti dar trijų 1863 m. sukilimo dalyvių palaikai. Iš viso aptikti 20 sukilėlių palaikai iš 21. Archeologinius tyrimus planuojama baigti iki šių metų pabaigos.




























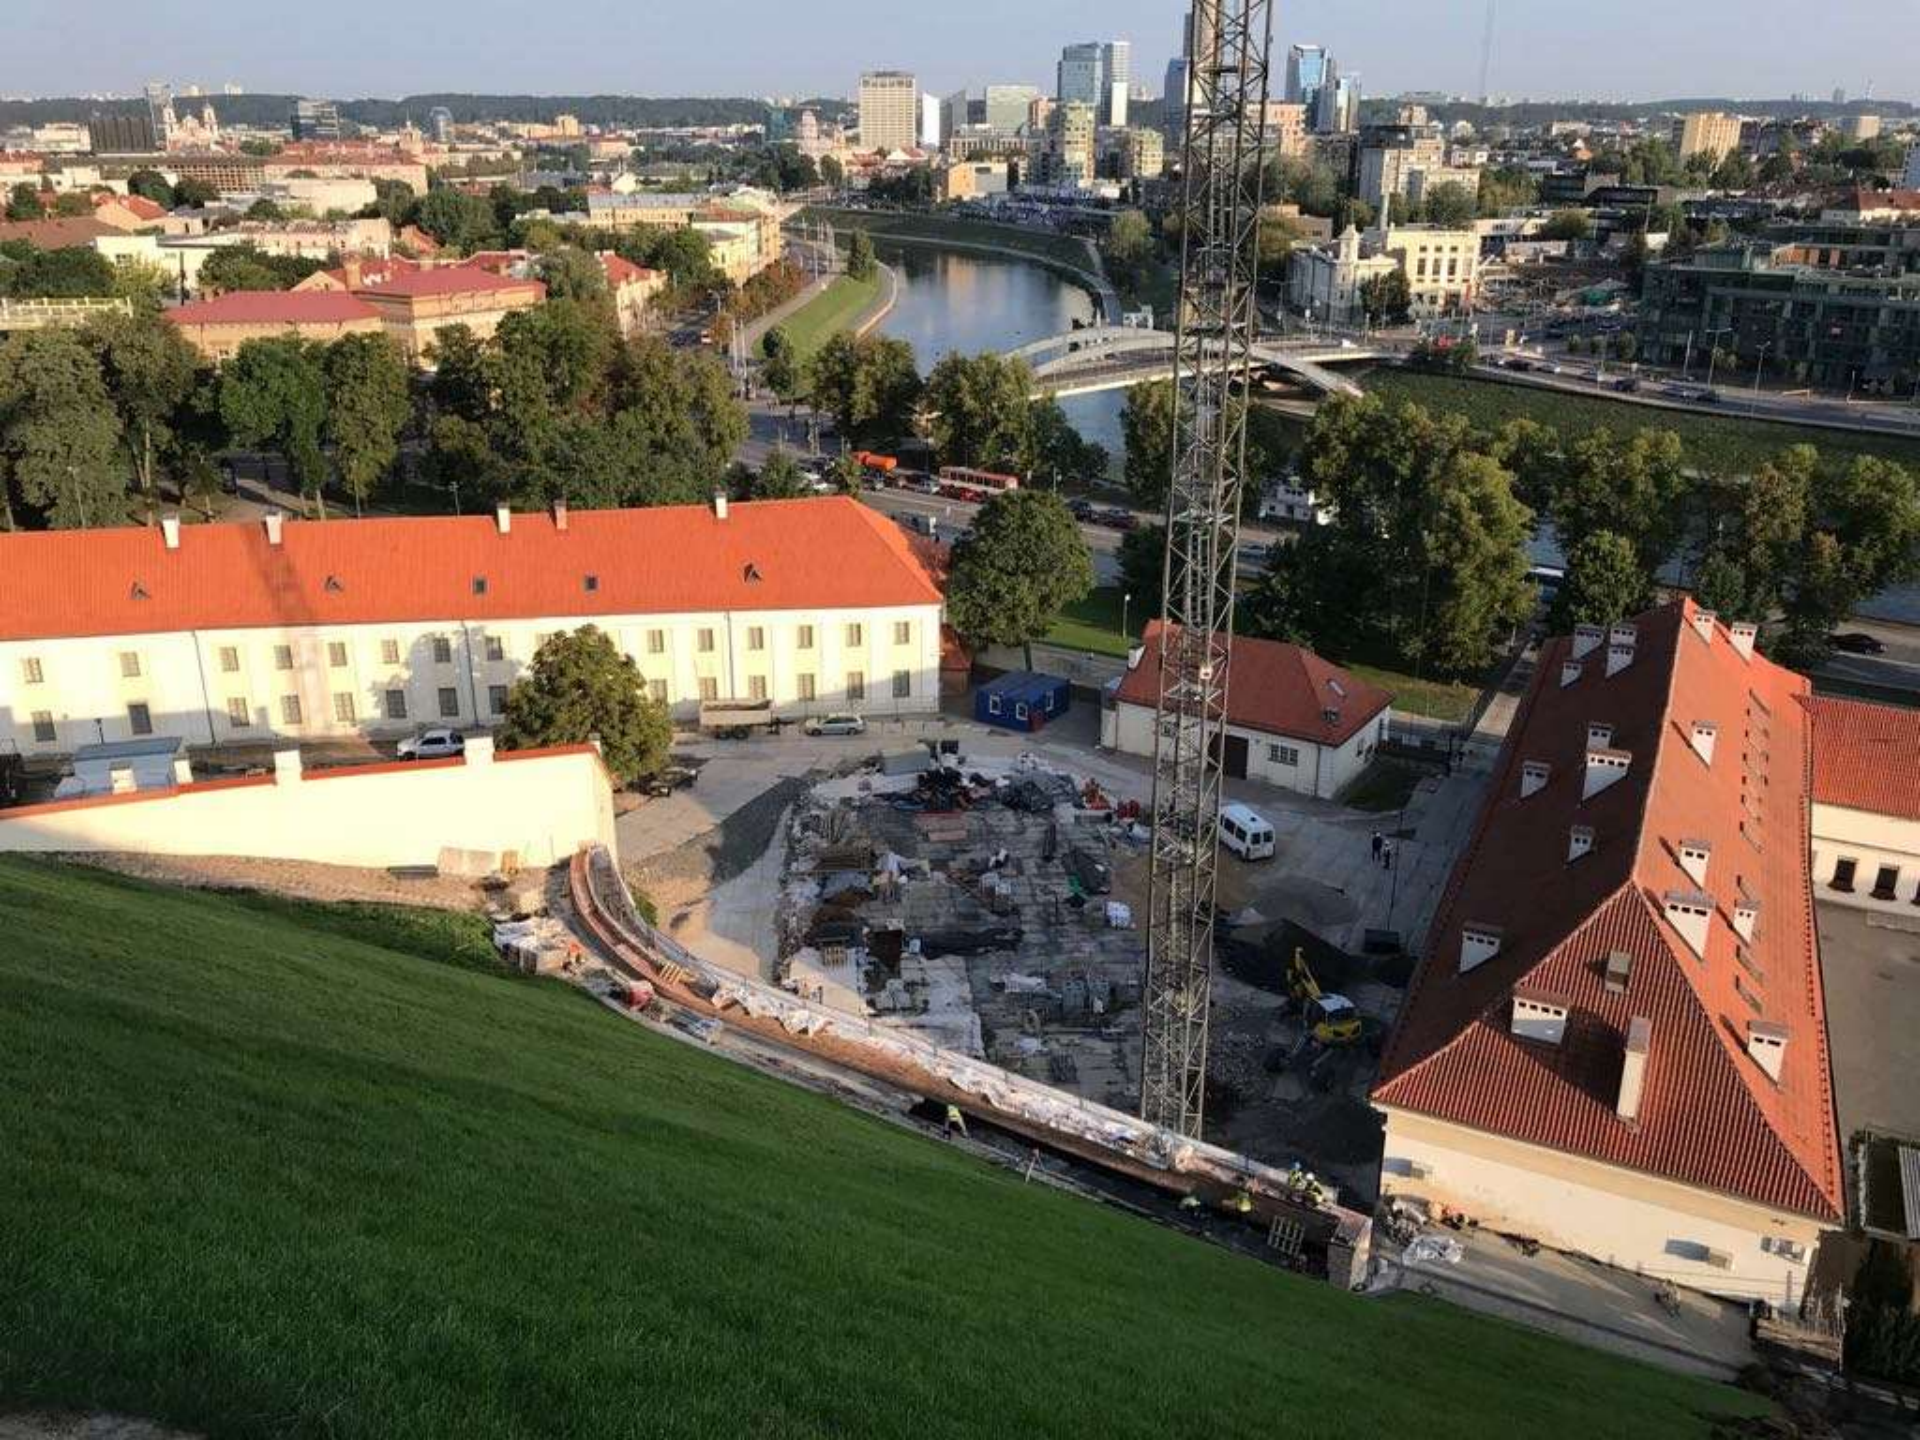















# Šiuo metu atlikti darbai

- Parengtas **Gedimino kalno aikštelės tvarkybos darbų projektas**. Šiuo metu pradėtos viešųjų pirkimų procedūros, laukiama rangovų pasiūlymų. Sąmatinė vertė 2474 tūkst. eurų.
- Atlikus dinaminio zondavimo tyrimus, parengtas **Gedimino kalno vakarinio šlaito neatidėliotinių darbų II etapo projektas**.



# Vykdomai darbai

- Muziejus šiuo metu rengia **Gedimino kalno šlaitų kompleksinio sutvarkymo projektavimo paslaugų atvirą tarptautinį pirkimą**. Numatoma pirkimo vertė 1,5 mln. eurų. Pirkimą planuojama paskelbti ne vėliau kaip iki šių metų rugsėjo 14 d.
- Kompleksiniam šlaitų sutvarkymui reikalingų lėšų poreikis bus žinomas parengus kompleksinio sutvarkymo projektinę dokumentaciją.
- Tarptautiniai nepriklausomi ekspertai turėtų būti pasitelkti būtent šioje kompleksinio projektavimo ir tyrimo stadijoje.
- Atlikus parengiamuosius darbus ir dinaminio zondavimo darbus, šiuo metu **baiginėjami Gedimino kalno pietrytinio šlaito ir pietrytinės gynybinės sienos prevencinių priemonių projektavimo darbai**. Juos planuojama pabaigti iki šių metų rugsėjo 10 d.




# Artimiausi darbai

- **Rytiniame šlaite** buvo pradėti neatidėliotini darbai. Jų metu įrengiami sausinamieji drenažiniai kanalai bei atidengiamos Gedimino kalno „šaltinėlio“ prieigos, siekiant gruntinius vandenis nukreipti į esamus lauko inžinierinius tinklus.
- Siekiant užbaigti Gedimino kalno **šiaurės vakarinio šlaito tvarkybos darbus**, būtina atstatyti lauko inžinierinius tinklus.
- Būtina užbaigti Gedimino kalno **vakarinio šlaito** avarijos grėsmės pašalinimo darbus, t.y. atlikti II etapo darbus.
- Baigus Gedimino kalno pietrytinio šlaito projektavimo darbus, būtina atlikti neatidėliotinus darbus, siekiant **stabilizuoti pietinio ir rytinio šlaitų sandūrą bei pietrytinę gynybinę sieną**.



*Šiaurės vakarų šlaite vykdomi tvarkymo darbai pagal projektą RS-147(2017)-TvDP-I-1*

*Nuošliaužos užpildos skaldą su drenažu*

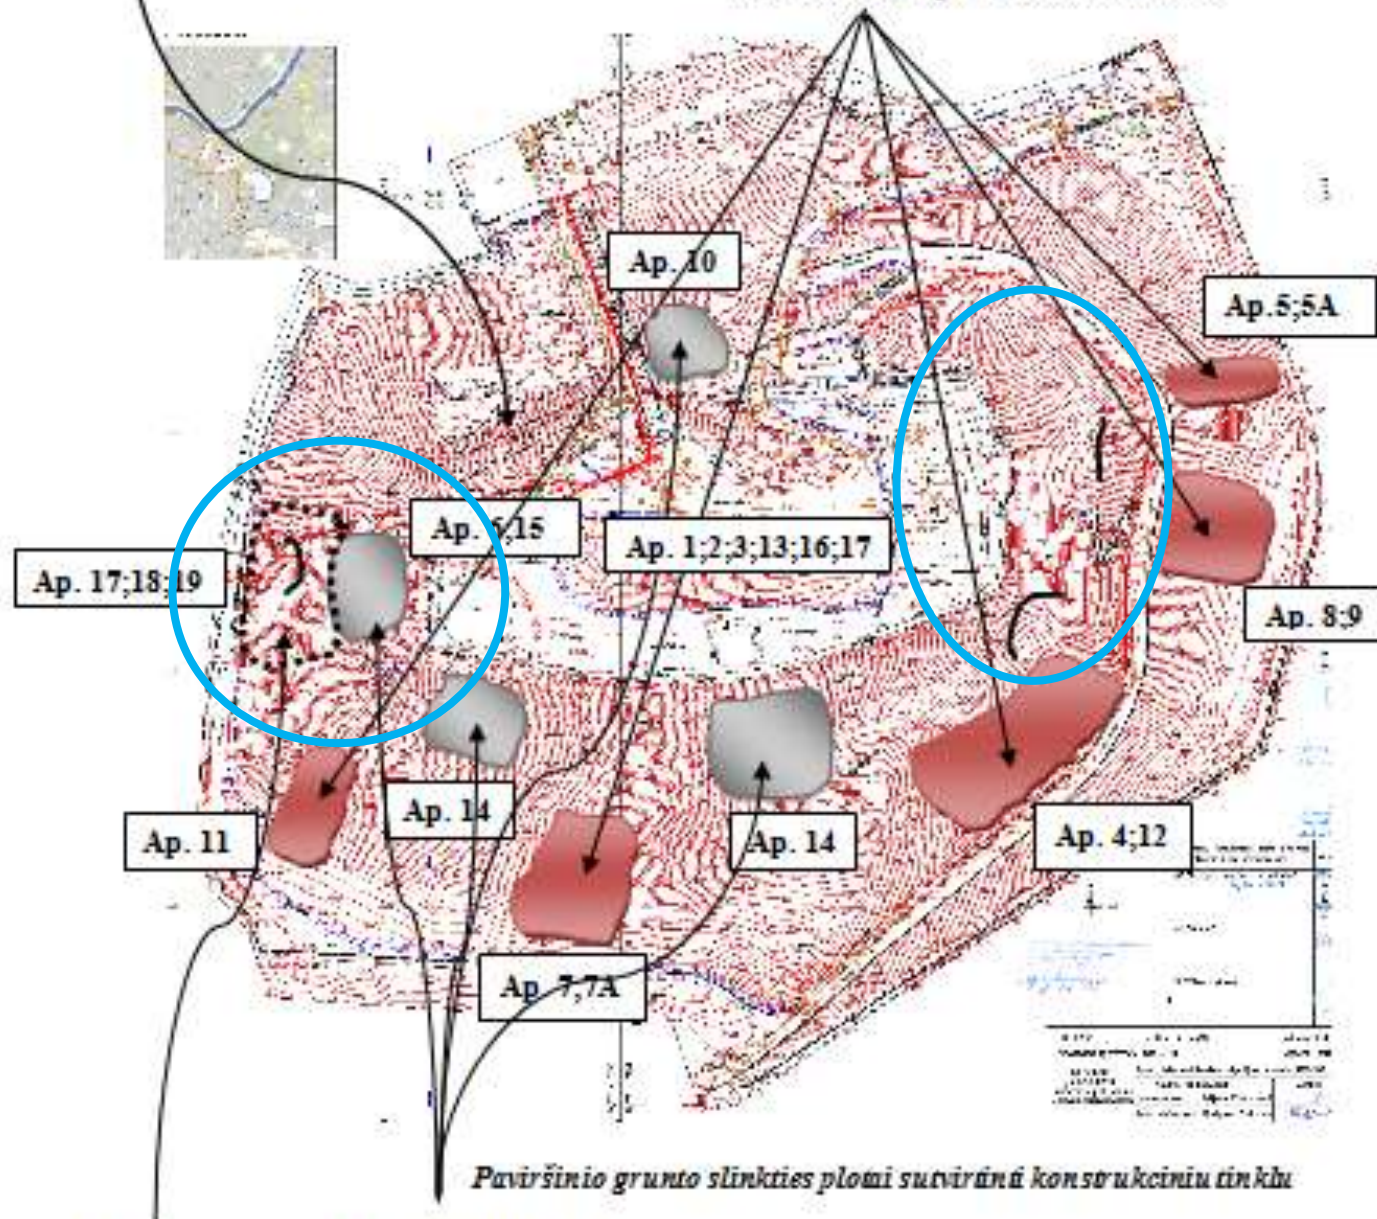

*Paviršinio grunto slinkties plomi sutvirtinti konstrukciniu tinklu*

*Pakloti sausinamieji drenažiniai kanalai*























**Ačiū už dėmesį**
