

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖS
PAŽYMA**

**DĖL 2014-2020 METŲ IGNALINOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020 M. ATASKAITOS IR
IGNALINOS PROGRAMOS 2021-2022 METŲ DARBO PROGRAMOS DOKUMENTO**

Nr.

Vilnius


Ataskaitos teikėjas – Energetikos ministerija

Ataskaitos tikslas: 1) pateikti informacija apie VĮ Ignalinos AE vykdytus projektus 2020 m. taip pat informaciją, susijusią su VĮ Ignalinos AE veiklos strategijos įgyvendinimo 2020 m. priemonių plano vykdymo pasiektais rezultatais ir finansine Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos dalimi; 2) Pristatyti Ignalinos programos 2021-2022 metų darbo programos dokumentą (toliau – DPD).

I. 2014-2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo per 2020 m. ataskaita

2020 metais IAE susidūrė su iššūkiais, susijusiais su pasauline COVID-19 pandemija. Nepaisant pandemijos keliamų iššūkių, IAE sauga nebuvo pažeista. IAE reaktorių blokai ir technologinė įranga buvo prižiūrimi pagal branduolinės saugos reikalavimus.


Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai finansuojami iš kelių šaltinių. Didžiąją finansavimo dalį sudaro ES parama, kurios dalį administruoja VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, o kitą dalį – Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo remimo fondo administratorius Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Lietuvos indėlis skiriamas iš trijų šaltinių – valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų ir VĮ Ignalinos AE sukauptų lėšų. Nuo paramos programos pradžios projektų vykdytojams ir administratoriams išmokėta **1 433,7 mln. eurų** ES lėšų.

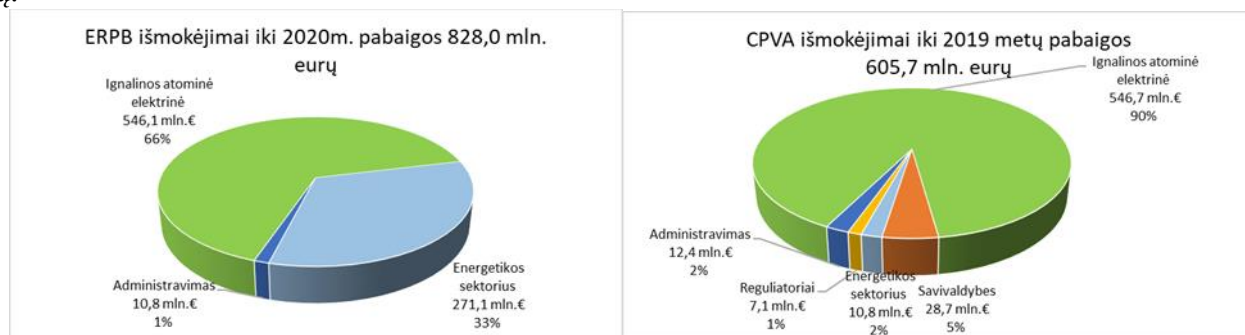

1 schema. Europos Sąjungos Ignalinos Programos išmokėtų lėšų pasiskirstymas pagal sektorius.

- ✓ Pažymėtina, kad efekto vertinimo kriterijaus E-02-01 „Pasiiekti Ignalinos AE vykdomų projektų įgyvendinimo rodikliai, procentais“ įvykdymas 2020 metų pabaigoje buvo – 72% (planuota - 100%). Antrojo efekto kriterijaus E-02-02 „Galiojančių Ignalinos AE VATESI išduotų licencijų dalis, procentais“ reikšmė 2020 m. - 100%. Pažymėtina, kad visiems Ignalinos AE nutraukimo fiziniams darbams neigiamos įtakos turėjo COVID-19 situacija.
- ✓ Per 2020 metus iš 6-ių Ignalinos programos priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų (70 529 tūkst. eurų), panaudota 75% proc., arba 52 764 tūkst. eurų. Vienoje iš 6 priemonių, „Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas“, buvo panaudota vos 38 proc. numatytų lėšų (dėl pakartotinai skelbiamo statybos darbų konkurso). Dviejose iš 6 priemonių panaudota daugiau lėšų, nei planuota. 2020 metų gale VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros banko sąskaitoje Ignalinos programos nepanaudotų lėšų likutis sudarė 3 568 tūkst. eurų.
- ✓ 2020 m. parduodant pripažintą nereikalingu arba netinkamu naudoti turtą bei vykdant investicinę ir kitą ūkinę veiklą, įmonėje gauta 0,379 mln. eurų pajamų.

Esama būklė: 2020 m. gruodžio mėn.

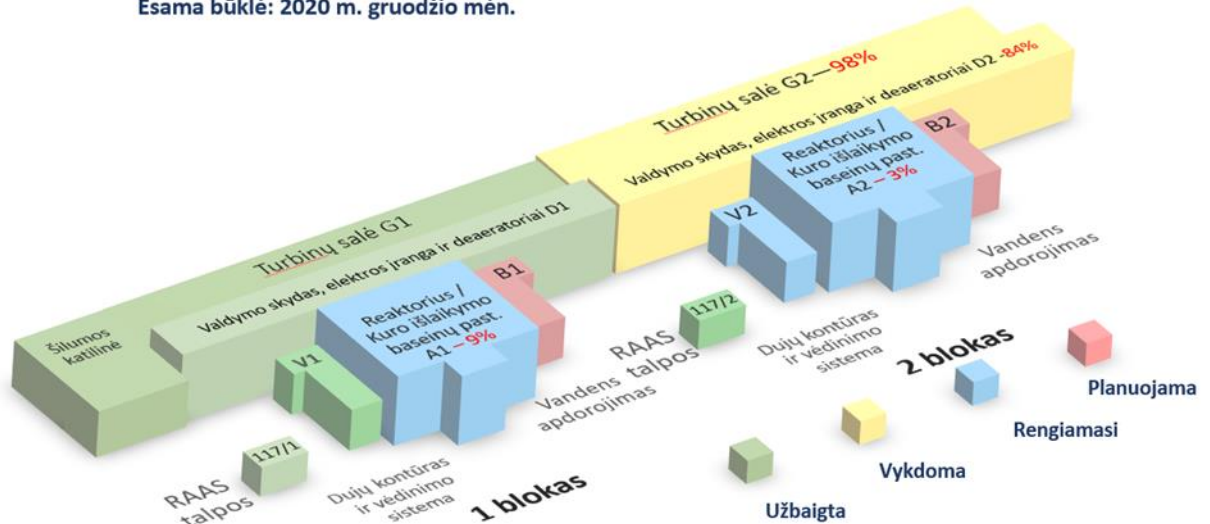

II. Ignalinos programos 2021-2022 metų darbo programos dokumentas

2021-2027 m. Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos laikotarpiui Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui finansuoti skirta 552 mln. eurų.

- ✓ IAE toliau rengia 1-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonų, esančių atitinkamai virš ir po reaktoriaus šerdimi, išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją. Projekto TP ir SAA yra parengti, tikimasi 2021 m. pirmąjį ketvirtį juos suderinti su VATESI.
- ✓ Norint sklandžiai tęsti IAE eksploatavimo nutraukimą, reikia gauti eksploatavimo nutraukimo licenciją, kai tik iš abiejų blokų bus pašalintas branduolinis kuras. Pagal dabartinę grafiką branduolinio kuro iškrovimas iš blokų bus baigtas 2022 m. lapkričio mėnesį, o eksploatavimo nutraukimo licencija gali būti išduota 2023 m. rugsėjo mėnesį.
- ✓ Siekdama sumažinti eksploatavimo sąnaudas taikant „Daryti ar pirkti“ metodikos kriterijus, IAE turi įvykdyti savo įsipareigojimą pasitelkti išorės organizacijas likusioms veikloms, nurodytoms „Daryti ar pirkti“ programoje, atlikti. Likusioms įsigyjamoms veikloms taikoma viešųjų pirkimų procedūra, visa „Daryti ar pirkti“ programa bus įgyvendinta 2021 metais.
- ✓ 2020 metų pirmąjį pusmetį buvo atliktas išsamus fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo galimybių tyrimas, kuriame buvo įvertinti 8 alternatyvūs tokios elektrinės įrengimo variantai, pasiūlyta optimali technologija ir atlikti preliminarūs skaičiavimai. Techniškai ir ekonomiškai optimaliausias variantas būtų 10,95 MW saulės elektrinės su dvipusiais moduliais, sumontuotais ant fiksuotos sistemos, įrengimas. Investicijos į tokią elektrinę sugrįžtų maždaug per 7,7 metų. Remiantis preliminariais skaičiavimais, tokia saulės elektrinė per 30 metų pagamintų apie 385 GWh elektros energijos ir leistų gauti apie 23,8 mln. Eur naudos, sumažinant sąnaudas. Šiuo metu IAE derina su Visagino savivaldybe savo sprendimą dėl fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo galimybių.

- ✓ Finansiniai 2021 m. įsipareigojimai: iki 2021 m. pabaigos planuojama priimti įsipareigojimų už 128,343 tūkst. eurų, atlikti mokėjimų už 90,972 tūkst. eurų, 2022 m. planuojama priimti įsipareigojimų už 100,520, atlikti mokėjimų už 120,275 tūkst. eurų.
- ✓ 2021 metais planuojama sumažinti VĮ Ignalinos AE darbuotojų skaičių nuo 1861 iki 1 830.

Dalykinio vertinimo išvada:

Siūlytina ataskaitą ir Ignalinos programos 2021-2022 metų darbo programos dokumentą svarstyti Vyriausybės pasitarime ir atsižvelgti Energetikos ministerijos pateiktą informaciją.

Patarėja

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė
