



ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO  
KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBĖS ĮMONĖ

PANEVĖŽIO FILIALAS

MIESTO, RAJONO  
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO BIURAS

**NEKILNOJAMOJO TURTO  
KADASTRO IR REGISTRO BYLA**

NR. 35 / 151810

TOMAS 1

*ELEKTROS TINKLŲ DRŪ LINIJA*

ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NR.:     /     :

INVENTORINIS NUMERIS 10839 (13434)

ADRESAS: Panevėžio m.

SAVITISKIO G.VE.


Pradėta 2003 08 25

Baigta .....

Lapų skaičius .....

Saugoti nuolat .....

Kontrolinė geodezinė nuotrauka M1:500

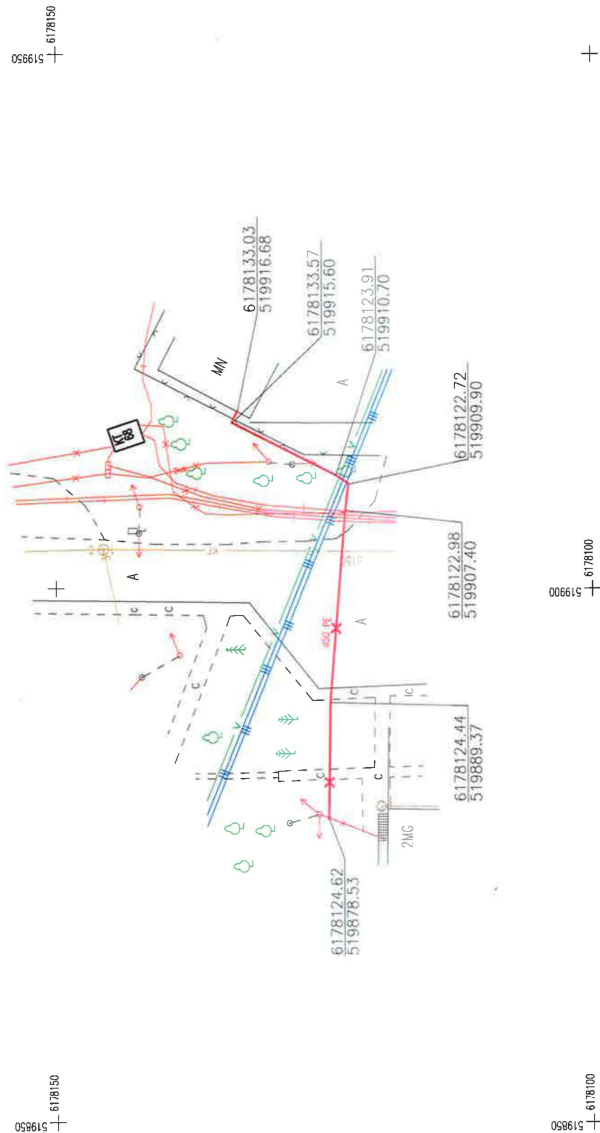

OBJEKTAS	Numėris topografinėje informaciniėje sistemoje	Elektros kabeliai Savitiškio g. 11A, Savitiškio g. 13 Panevėžys,
GEODEZININKAS	Koordinatų sistema: LKS-94	Aukštųjų sistema: BALTIOS 1977m
	Vardas ir pavardė	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. IOKV-6
	PARAŠAS	DATA
		2015 05

**P a ž y m a**

apie atliktų darbų ir išlaidų vertę per 2015 m. gegužės mėn. 1-31 d.

**Užsakovas:** VĮ „Panevėžio miškų urėdija“ PVM mokėtojo kodas LT686891917

**UAB „ŠIAULIŲ RYMONTA“**  
Metalistų g. 2c, LT-78107 Šiauliai  
įmonės kodas 145841261  
PVM mokėtojo kodas LT458412610

**Rangovas:** UAB „ŠIAULIŲ RYMONTA“

a. s. Nr. LT487044060002327913; AB SEB bankas

**Statybos pavadinimas:** Lauko 0,4 kV elektros kabelinės linijos iš KS-2716 pertvarkymas  
Savitiškio g. 13, Panevėžys

**Rangos sutartis Nr. T 15-03/01 PMŪ/LEKL**, pasirašyta 2015 metų kovo 09 dieną

Vykdytojas	Sutartinė kaina, €	Nuo statybų pradžios, €				Per ataskaitinį laikotarpį, €			
		Bendra SMD vertė		PVM	Bendra SMD vertė		Projektavimo ir kitos ne SMD išlaidos	PVM	
		SMD	Kitos išlaidos		SMD	Kitos išlaidos			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iš viso	2843,50	2105,28		244,72	493,50	2105,28		244,72	493,50
Iš jų:									
lauko 0,4 kV elektros kabelinė linija	2350,00	2105,28		244,72		2105,28		244,72	
pridėtinės vertės mokestis 21,00 %	493,50				493,50				493,50
<b>Suma žodžiais: du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys Eurai 50 euro centų</b>									
<b>Papildomai galutinė suma Litais: (9818,02 LTL) devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika Litų 02 centai</b>									

**Viso apmokėjimui: 2843,50 € (9818,02 LTL)**

t. sk. atliktų darbų: 2350,00 €

PVM 21,00 %: 493,50 €

Perdavė:


Priėmė:

2015 m ..... mėn ..... d.

2015 m ..... mėn ..... d.

A. V.

A. V.





UAB "GEO 9"

Lentpjūvių 13, Panevėžys tel. 868631267 faks. 845463137 panevezys@topcon.lt

Licencijų Nr. 312TK-711, 312G-711, G-1177-(711), G-838-(711), TK-1177-(711)

*Elektras kabeliai Samiščio g. 11A, Samiščio g. 13 Panevėžys*

KONTROLINĖ GEODEZINĖ NUOTRAUKA M1:500



Kvalifikacija, pažymėjimas  
(GVY-6)  
Licencijų Nr.  
312TK-711, 312G-711  
Pareigos  
Vadovas

x z



UAB

"GEO 9"

Panevėžys

Lentpjūvių 13, Panevėžys

868631267 faks. 845463137

Panevėžys

2015

A.V.

### INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮKAINOJIMAS

Objekto pavadinimas \_\_\_\_\_  
 Objekto adresas Spektyvos tinklų oro linija  
SAKVIŠKIO G. 2E

Dendras statybos kainų indeksas 14,590

Vietovės pataisos koef. 100

Inž. tinklų elementų pavadinimas	Atskaitos taškai	Statybos metai	Markė, tipas, medžiaga	Skersmuo (mm)	Gylis (m)	Mato vnt.	Kiekis	Kainin. Nr. Lent. Nr.	Vnt. kaina (Lt)	Vnt. kaina įvertinus koef. (Lt)	Atstatymo kaštų (statybinei) vertė (Lt)	Nusidėvėjimo %	Atstatomoji vertė (Lt)	Vietovės pataisos koef.	Vidutinė rinkos vertė
566102 tinklai	2 LINIJOS ILGIS: (TP-68 iki A); (TP-68 iki D) STRAMOS Ø/6 (B-H); (G-R); (J-M); (E-P) STRAMOS Ø/6 SU ŽVIEŽTUVU	3	4 APR A-25 APR 3HVZT APR A-16 APR A1 APR A15-180	5	6	7 M vnt M vnt vnt	8 5410 6 32370 9 1	9 5-110 5-110	10 3110 2990	11 45329 43629 18784	12 2482 16302	13 75 75	14 621 4076 4697	15 1.0 1.0	16 621 4076 4697

2008 02 mėn 25 d.

Sudarė: \_\_\_\_\_

Tikrino: \_\_\_\_\_ Grupės vadovas



**Pastaba:**



Zemės kasimo darbus persikirtimuose su esamomis požeminėmis komunikacijomis vykdyti tik rankiniu būdu, kabelį klojant apsauginiame vamzdyje (išsikvietus tinklų savininkų atstovus).

Kvalifikacija pažymėjimas UAB „GEO 9“ Laisvės pl. 11, Panevėžys tel. 86631037 faks. 86631317 31727-711/3172-711	
Pasirašė	2014.12
UAB „GEO 9“	A.V.
Elektro kabeliai Savitikių g. 11A, Savitikių g. 13 Panevėžys TOPOGRAFIJŲ NUOTRAUKA M1:500 Lemp' skaitmenis Lemp' Nr.	
OBJEKTAS	

Koordinatų sistema UKS-94  
 Aukštųjų sistema – Baltijos  
 Geodezijos pagrindas – LIP05



**KABELIO PAJUNGIMO SCHEMA**

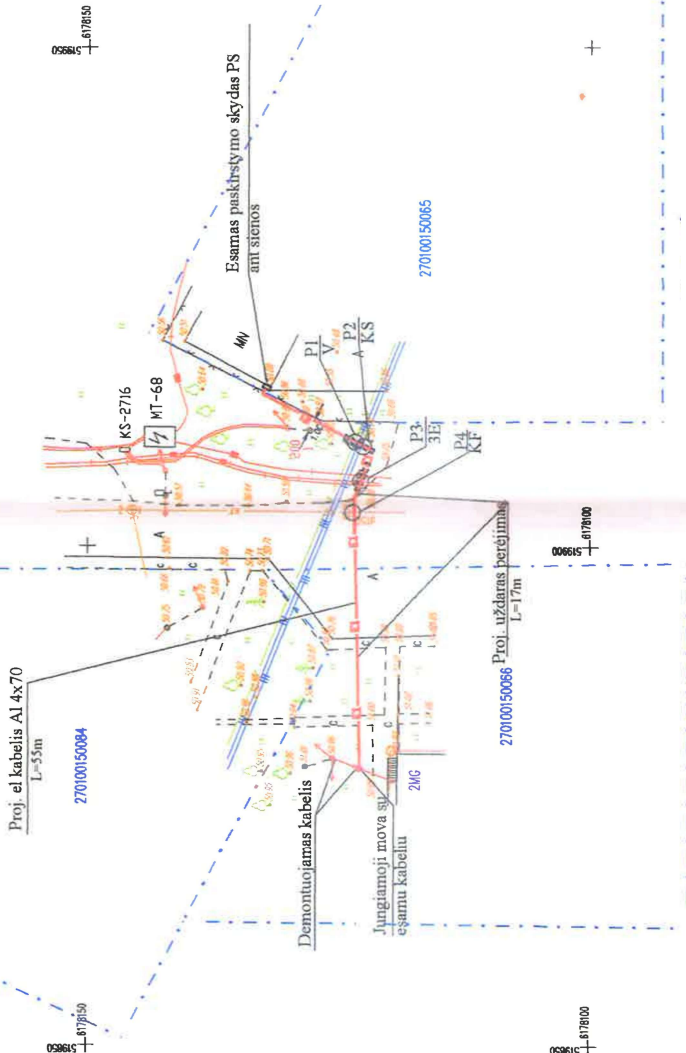

Sąjūda su VALMIKŠTAIČIŲ VANDENYNE  
*Čiulėnų gatvė 10-13*

**SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI**

- EI - proj. abonentinis el. kabelis
- ◇ - jungiamoji mova

Nr. 6212	Smilga, A. 112, LT-08113 PANEVĖŽYS, LIETUVA Tel. (86) 616411	Braižinys	Lauko 0,4 kV elektros kabelinės linijos iš KS-2716 perstatymas, Savitikių g. 13, Panevėžys
22089	PDV	2015 03	
	PDVA	2015 03	
Etapas	VĮ "Panevėžio miškų urėdija"		Genplanas su proj. lauko elektros tinklais
TDP	R-15-026-TDP-LE-1		Braižinio Nr.





**P a ž y m a**

apie atliktų darbų ir išlaidų vertę per 2015 m. gegužės mėn. 1-31 d.

**Užsakovas:** VĮ „Panevėžio miškų urėdija“ PVM mokėtojo kodas LT686891917

**UAB „ŠIAULIŲ RYMONTA“**  
Metalistų g. 2c, LT-78107 Šiauliai  
įmonės kodas 145841261  
PVM mokėtojo kodas LT458412610

**Rangovas:** UAB „ŠIAULIŲ RYMONTA“

a. s. Nr. LT487044060002327913; AB SEB bankas

**Statybos pavadinimas:** Lauko 0,4 kV elektros kabelinės linijos iš KS-2716 pertvarkymas Savitiškio g. 13, Panevėžys

**Rangos sutartis Nr. T 15-03/01 PMŪ/LEKL**, pasirašyta 2015 metų kovo 09 dieną

Vykdytojas	Sutartinė kaina, €	Nuo statybų pradžios, €				Per ataskaitinį laikotarpį, €			
		Bendra SMD vertė		PVM	Bendra SMD vertė		Projektavimo ir kitos ne SMD išlaidos	PVM	
		SMD	Kitos išlaidos		SMD	Kitos išlaidos			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iš viso	2843,50	2105,28		244,72	493,50	2105,28		244,72	493,50
Iš jų:									
lauko 0,4 kV elektros kabelinė linija	2350,00	2105,28		244,72		2105,28		244,72	
pridėtinės vertės mokestis 21,00 %	493,50				493,50				493,50
<b>Suma žodžiais: du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys Eurai 50 euro centų</b>									
<b>Papildomai galutinė suma Litais: (9818,02 LTL) devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika Litų 02 centai</b>									

**Viso apmokėjimui: 2843,50 € (9818,02 LTL)**

t. sk. atliktų darbų: 2350,00 €

PVM 21,00 %: 493,50 €

Perdavė:

Priėmė:

2015 m. ....mė

2015 m. ....mėn. ....d.

A. V.



**Užsakovas:** VĮ „Panevėžio miškų urėdija“

**Rangovas:** UAB „Šiaulių Rymonta“

**Sutartis:** Rangos sutartis Nr. T 15-03/01 PMŪ/LEKL iš 2015 m. 03 mėn. 09 d.

**Objektas:** Lauko 0,4 kV elektros kabelinės linijos iš KS-2716 pertvarkymas Savitiškio g. 13, Panevėžys

**Žiniaraštis:** 1 Lauko 0,4 kV elektros kabelinė linija

### ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

už 2015 metų gegužės mėnesį

Suma žiniaraščiui: 2.843,50 € 9.818,02 LTL

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 MEDŽIAGOS</b>						
1	M000	Kabelis al. gyslomis Al 4x70mm2	m	55,00	5,9546	327,50
2	M001	Tripolis kirtiklis 3F, 200A	vnt.	1,00	64,5795	64,58
3	M002	Galinės lauko movos kabeliui iki 70mm2	vnt.	2,00	39,5708	79,14
4	M004	Antgaliai gyslai iki 70mm2	vnt.	8,00	4,6947	37,56
5	M005	Vamzdis plastikinis HDPE 110	m	28,00	3,3364	93,42
6	M006	Signalinė juosta "STOP"	m	21,00	0,0956	2,01
7	M007	Metalinė kabelių apsauga atramoje	vnt	2,00	40,6279	81,26
8	M008	Įžeminimo kontūras 10 omų varžai	kompl.	1,00	130,9488	130,95
9	M009	Vamzdžių sandarinimo masė	vnt.	2,00	26,1006	52,20
10	M010	Smėlis	m3	2,00	17,0702	34,14
11	M011	Žolės sėklos	kg	1,00	5,1205	5,12
12	TR1	Trasos nužymėjimas	vnt.	1,00	98,2478	98,25
13	TR2	Kabelinės trasos pririšimas	vnt.	1,00	129,5297	129,53
<b>Skyriuje 1</b>						<b>1135,65</b>
<b>2 STATYBOS MONTAVIMO DARBAI</b>						
1	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas ekskavatoriais grunte k1=1.15,k2=1.30,k3=2.000,k4=2.000,k8=3.00,k9=1.15	km	0,02	1839,3738	29,43
2	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas k1=1.30,k2=1.30,k3=2.000,k4=2.000,k8=3.00,k9=1.15	km	0,02	430,2016	6,88
3	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu k1=1.30,k9=1.15	km	0,01	5533,1905	27,67
4	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu k1=1.30,k9=1.15	km	0,01	2212,6303	13,28
5	N22-478	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio grėž. įreng., vamzdį (trasos ilgis) k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	m	20,00	26,5611	531,22
6	N34-89	Polietileningų vamzdžių paklojimas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m	0,08	210,8028	16,86
7	N21-300	Įvadų hermetizacija sandarinimo mase	vnt	6,00	4,5499	27,30
8	N21-25	Kabelio tiesimas vamzdžiuose,	100m	0,28	233,7205	65,44
9	N21-11	Kabelio tiesimas tranšėjoje	100m	0,21	166,1405	34,89
10	N21-289	Atraminių kabelinių konstrukcijų stovų į montavimas	100vnt	0,02	222,2747	4,45
11	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k1=1.30,k9=1.15	km	0,02	77,5516	1,63
12	N21-557	Iki 250 A galios kirtiklių montavimas spintose	vnt	1,00	14,3507	14,35
13	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos montavimas	vnt.	2,00	14,4376	28,88
14	N21-279	Antgalių prijungimas, presuojant prie gyslų k1=0.75	100vnt	0,08	196,9040	15,75
15	N21-287	Gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų k1=0.25	100vnt	0,08	134,1954	10,74
16	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k1=1.30,k3=2.000,k9=1.15	100m	0,21	76,6161	6,09

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
17	N1-381	I-II grupės grunto plūkimas k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,02	289,6258	5,79
18	N48-258	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu k1=1.40,k9=1.15	100m2	0,02	231,0589	4,85
19	N48-295	Gazonų užsėjimas rankiniu būdu k1=2.00,k9=1.15	100m2	0,02	106,9885	2,25
20	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas k1=1.30	vnt.	1,00	19,0744	19,07
21	N21-286	Kabelių gyslų prijungimas prie aparatų gnybtų k1=0.25	100vnt	0,08	121,7041	9,74
22	D1-637	Kabelių gyslų markiravimas k1=1.30	vnt.	8,00	1,2888	10,31
23	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo k1=1.15,k2=1.15	kompl.	1,00	25,9181	25,92
24	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas k1=1.20,k2=1.20	vnt	1,00	23,6649	23,66
25	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m2	0,04	104,5818	4,18
26	N27-214-2	Betono plytelių šaligatvių įrengimas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m2	0,04	475,1564	19,01
		<b>Skyriuje 2</b>				<b>969,63</b>
		<b>3 PROJEKTAVIMO PASLAUGOS</b>				
1	PRP	Projektavimo darbai		1,00	244,7186	244,72
		<b>Skyriuje 3</b>				<b>244,72</b>
		<b>Žiniaraštyje 1</b>				<b>2350,00</b>
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				493,50
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				<b>2843,50</b>

**Suma žodžiais: du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys Eurai 50 euro centų**

**Papildomai galutinė suma Litais: (9818,02 LTL) devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika Litų 02 centai**

Priėmė:

Pridavė:



## Ilgalaikio turto apskaitos kortelė

IT pavadinimas **Elektros tinklų oro linijos**Inv.nr **21-0083**Inv.grupė **12102**Metinė nusidėvėjimo norma % **1,864**Likvidacinė vertė **304,11**Eksploatavimo pradžia **1972-01-01**metais **53,647**

Eur

Galutinio nusidėvėjimo data **2025-09-01**

## Nusidėvėjimas

Metai	I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Metinė suma				
	01mėn	02mėn	03mėn	Iš viso	04mėn	05mėn	06mėn	Iš viso	07mėn	08mėn	09mėn	Iš viso		10mėn	11mėn	12mėn	Iš viso
2021	40.40	40.40	40.40	121.20	40.40	40.40	40.40	121.20	40.40	40.40	40.40	121.20	40.40	40.40	40.40	120.98	
2022	40.40	40.40	40.40	121.20	40.40	40.40	40.40	121.20	40.40	40.40	40.40	121.20	40.40	40.40	40.40	121.20	484.80
2023	40.40	40.40	40.40	121.20	40.40	40.40	40.40	121.20	40.40	40.40	40.40	121.20	40.40	40.40	40.40	121.20	484.80
2024	40.40			40.40													40.40

## Gavimas, perdavimai, nurašymas, vertės keitimo istorija

Data	Dokumentas	Suma	Prad. vertė	Nusidėv.	Operacija
21-12-31	Li.kučiai		7403,54	5281,43	
	Dabar.būsena		7403,54	6291,43	

# **TECHNINĖ DOKUMENTACIJA**

**OBJEKTAS: LAUKO 0,4 kV ELEKTROS KABELINĖS LINIJOS IŠ KS-2716 PERTVARKYMAS**

**UŽSAKOVAS: VĮ „PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJA“**

**RANGOVAS: UAB „ŠIAULIŲ RYMONTA“**

**ADRESAS: SAVITIŠKIO G. 13, PANEVĖŽYS**

**2015**

Dokumentacijos pateikimas priduodant lauko 0,4 kV elektros kabelinės linijos iš KS-2716 pertvarkymas Savitiškio g. 13, Panevėžys

### REJESTRAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento Nr.	Išdavimo data	Kas išdavė dokumentą	Lap. Sk.
1.	Pažyma	15 05/03	2015 05 15	UAB „Šiaulių Rymontą“	1
2.	Elektros montavimo darbų priėmimo-perdavimo Aktas	15 05/03	2015 05 15	UAB „Šiaulių Rymontą“	1
3.	Lauko elektros tinklų techninis-darbo projektas	R-15-026	2015	UAB „Šiaulių Rymontą“	5
4.	Geodezinė kontrolinė nuotrauka	2015	2015	UAB „GEO9“	2
5.	Jėgos, apšvietimo instaliacijos varžos ir elektros įrengimų pereinamosios varžos matavimo protokolas	73-1	2015 05 08	UAB „Voltas“	1
6.	Grandinės nuo žemintuvų (įnulinimo magistralės) iki žeminamų (įnulinamų) elementų tikrinima	73-2	2015 05 08	UAB „Voltas“	1

Rejestrą sudarė \_\_\_\_\_

(parašas, pavardė, pareigos) *l*

Likę dokumentai paliekami el. įrenginių savininkui \_\_\_\_\_

(parašas, pavardė, pareigos)
