

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
STRATEGINIO PLANAVIMO IR STEBĖSENOS GRUPĖ**

**PAŽYMA
DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO
VYKDYMO PAŽANGOS IKI 2018 M. III KETVIRČIO PABAIGOS**

2018-10-26 Nr.NV-2846

1. Projekto rengėjas – Vyriausybės kanceliarija.

2. Projekto tikslas – informuoti Vyriausybę ir visuomenę apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau – LRV planas) vykdymo pažangą, pateikiant ataskaitą apie LRV plane suplanuotų veiksmų vykdymo rezultatus, pasibaigus 2018 m. III ketvirčiui.


3. Projekto esmė. Ataskaitoje pateikiama:

- bendra statistika apie LRV plano vykdymo pažangą nuo LRV plano vykdymo pradžios iki 2018 m. III ketv. pabaigos;
- informacija apie 2018 m. III ketv. suplanuotų veiksmų vykdymą;
- informacija apie vėluojamus įvykdyti veiksmus, kuriuos buvo suplanuota įvykdyti 2017 m. – 2018 m. II ketv. laikotarpiu. (informacija apie jau įvykdytus veiksmus buvo pateikta ankstesnėse ataskaitose).

BENDRA STATISTIKA

Viso LRV plane per 2017-2020 metus numatyta įvykdyti 795 veiksmus.

2017 m. – 2018 m. III ketv. laikotarpiu suplanuota įvykdyti **316 veiksmų** (39 proc. visų LRV plano veiksmų). 2018-10-15 duomenimis, **įvykdyti 244 veiksmai, t. y. 77 proc., o vėluojama įvykdyti 72 veiksmus, t. y. 23 proc.** nuo visų 2017 m. – 2018 m. III ketv. laikotarpiui suplanuotų veiksmų.

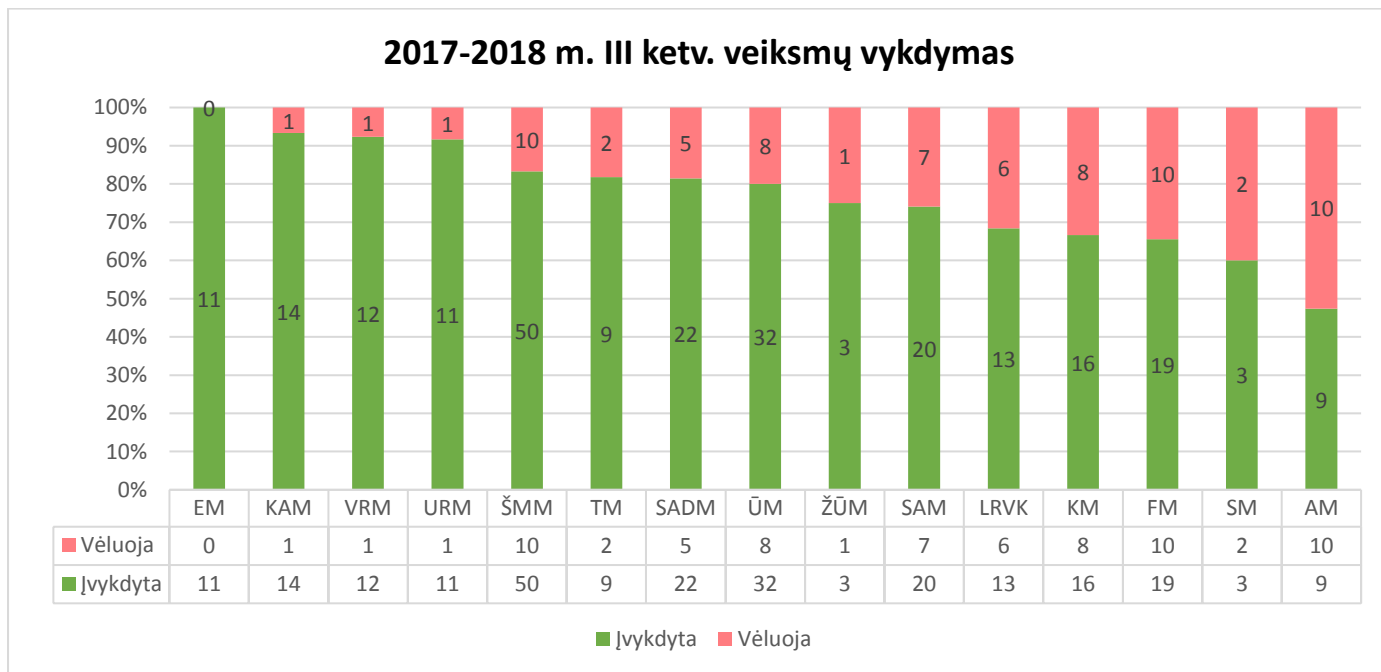

Analizuojant visų veiksmų vykdymą, galima pastebėti, kad **daugiausiai veiksmų yra įvykdžiusios tos ministerijos, kurioms ir buvo pavesta įvykdyti daugiausiai veiksmų**, t. y. Švietimo ir mokslo ministerija įvykdė **50** veiksmų (iš suplanuotų 60 veiksmų) ir Ūkio ministerija įvykdė **32** veiksmus (iš suplanuotų 40 veiksmų).

Didžiausią pažangą yra padariusi Energetikos ministerija, kuri yra įvykdžiusi visus suplanuotus 11 veiksmų (100 proc.). Krašto apsaugos ministerija yra įvykdžiusi 14 veiksmų iš suplanuotų 15 veiksmų (93 proc.), o Užsienio reikalų ministerija ir Vidaus reikalų ministerija yra įvykdžiusios po 92 proc. suplanuotų veiksmų.

Daugiausiai veiksmų **vėluoja vykdyti** Aplinkos, Finansų ir Švietimo ir mokslo ministerijos, kurios iki galo neįvykdė **po 10 veiksmų**.


Prasčiausią pažangą pagal vėluojamų veiksmų dalį nuo suplanuotų veiksmų, padarė šios ministerijos:

- Aplinkos ministerija, kuri vėluoja įvykdyti 10 iš 19 suplanuotų veiksmų (53 proc.);
- Susiekimo ministerija, kuri vėluoja įvykdyti 2 iš 5 suplanuotų veiksmų (40 proc.);
- Finansų ministerija, kuri vėluoja įvykdyti 10 iš 29 suplanuotų veiksmų (35 proc.);
- Kultūros ministerija, kuri vėluoja įvykdyti 8 iš 24 suplanuotų veiksmų (33 proc.).

2018 M. III KETV. SUPLANUOTŲ VEIKSMŲ VYKDYMAS

2018 m. III ketv. buvo suplanuota įvykdyti **35** veiksmus (**4,4 proc.** nuo visų LRV plano veiksmų).

2018-10-15 duomenimis, **įvykdyta 17** veiksmų (49 proc.), **vėluojama baigti vykdyti 18 veiksmų** (51 proc.).

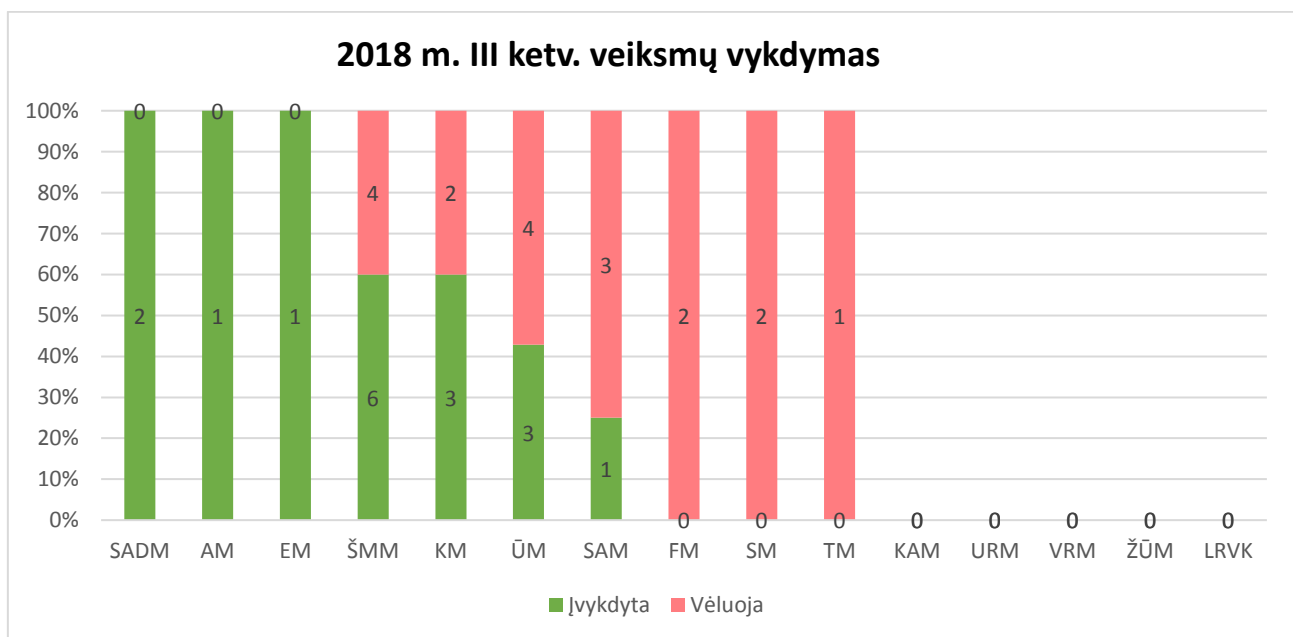

- Didžiausias įvykdytų veiksmų skaičius: **ŠMM** (6 vnt.), **KM** (3 vnt.), **ŪM** (3 vnt.).
- Didžiausias vėluojamų vykdyti veiksmų skaičius: **ŠMM** (4 vnt.), **ŪM** (4 vnt.), **SAM** (3 vnt.).

Nebuvo suplanuoti 2018 m. III ketv. veiksmai 4 ministerijoms: KAM, URM, VRM ir ŽŪM.

4. Derinimas. Ataskaitos projektas parengtas pagal institucijų į Stebėsenos informacinę sistemą suvestus duomenis (iki 2018 m. spalio 15 d.). Projektas derintas su Vyriausybės kanceliarijos ir Ministro Pirmininko patarėjais, pataisytas pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

5. Atitiktis Vyriausybės programai. Informacija apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymą atskleidžia Vyriausybės programos įgyvendinimo pažangą.

6. Dalykinio vertinimo išvada. Ministerijos, atsiskaitydamos už laiku neįvykdytus LRV plano veiksmus, pateikė įvairius argumentus. Pagrindinės vėluojamų įvykdyti veiksmų priežastys: užtrunka teisės akto projekto parengimas ir jo derinimas; veiksmų įvykdymas priklauso nuo kitų institucijų ir organizacijų įsitraukimo ir bendradarbiavimo. Pažymėtina, kad nemaža dalis Vyriausybei pateiktų teisės aktų yra grąžinami patobulinti, todėl užsitęsia jų priėmimas. Dalis veiksmų (12) yra tik iš dalies įvykdyti, nes Seimas dar nesvarstė arba nepriėmė Vyriausybės pateiktų įstatymų projektų.

Siūloma klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime, o pasitarimo protokolinio sprendimo projekte įrašyti:

1. Atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažangos ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie suplanuotų veiksmų vykdymo pažangą iki 2018 metų III ketvirčio pabaigos (pridedama).

2. Pavesti ministrams užtikrinti, kad vėluojami įvykdyti 2017 metų ir 2018 metų I–III ketvirčių veiksmai būtų kuo skubiau įvykdyti.

3. Pavesti Vyriausybės kanceliarijai organizuoti pasitarimus, kuriuose su Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kultūros ministerijos atstovais būtų aptartos priemonės ir būdai, kaip paspartinti vėluojančių veiksmų įvykdymą.

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės
patarėja

Nijolė Kundrotienė

Nijolė Kundrotienė, tel. 8 706 63 815, el. p. nijole.kundrotiene@lr.lt
