

PAŽYMA
DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO
VYKDYMO PAŽANGOS IKI 2020 M. II KETV. PABAIGOS ATASKAITOS

2020-08-14 Nr. NV-2261

1. Projekto rengėjas – Vyriausybės kanceliarija.

2. Projekto tikslas – informuoti apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau – LRV planas) vykdymo iki 2020 m. II ketv. pabaigos pažangą, pateikiant ataskaitą apie suplanuotų veiksmų vykdymo rezultatus.

3. Projekto esmė. Ataskaitoje pateikiama:

- informacija apie įvykdytus 2020 m. I-II ketv. LRV plano veiksmus;
- informacija apie vėluojamus įvykdyti veiksmus, kuriuos buvo suplanuota įvykdyti 2017 m.–2020 m. II ketv. laikotarpiu.


BENDRA STATISTIKA:

Vyriausybės programos įgyvendinimo plane viso numatyta įvykdyti **797 veiksmus**:

- 2017 m.** buvo suplanuota įvykdyti **148 veiksmus**, iš jų **įvykdyti 147** veiksmai (99 proc.), **AM vėluoja įvykdyti 1 veiksmą** (1 proc.);
- 2018 m.** buvo suplanuota įvykdyti **278 veiksmus**, iš jų **įvykdyti 267** veiksmai (96 proc.), vėluojama įvykdyti **11 veiksmų** (4 proc.);
- 2019 m.** buvo suplanuota įvykdyti **149 veiksmus**, iš jų **įvykdyti 108** veiksmai (72 proc.), vėluojama įvykdyti **41 veiksmą** (28 proc.);
- 2017-2019 m.** suplanuota įvykdyti **575 veiksmus**, iš jų **įvykdyti 522** veiksmai (91 proc.), vėluojama įvykdyti **53 veiksmus** (9 proc.).

Iki 2020 m. II ketv. pab. viso suplanuota įvykdyti 609 veiksmus, iš jų **įvykdyti 535** veiksmai (88 proc.), vėluojama įvykdyti **74 veiksmus** (12 proc.).

**LRV plano veiksmų vykdymas (2017-2020 m. II ketv.),
pasibaigus 2020 m. II ketv. (2020-07-30 duomenys)**

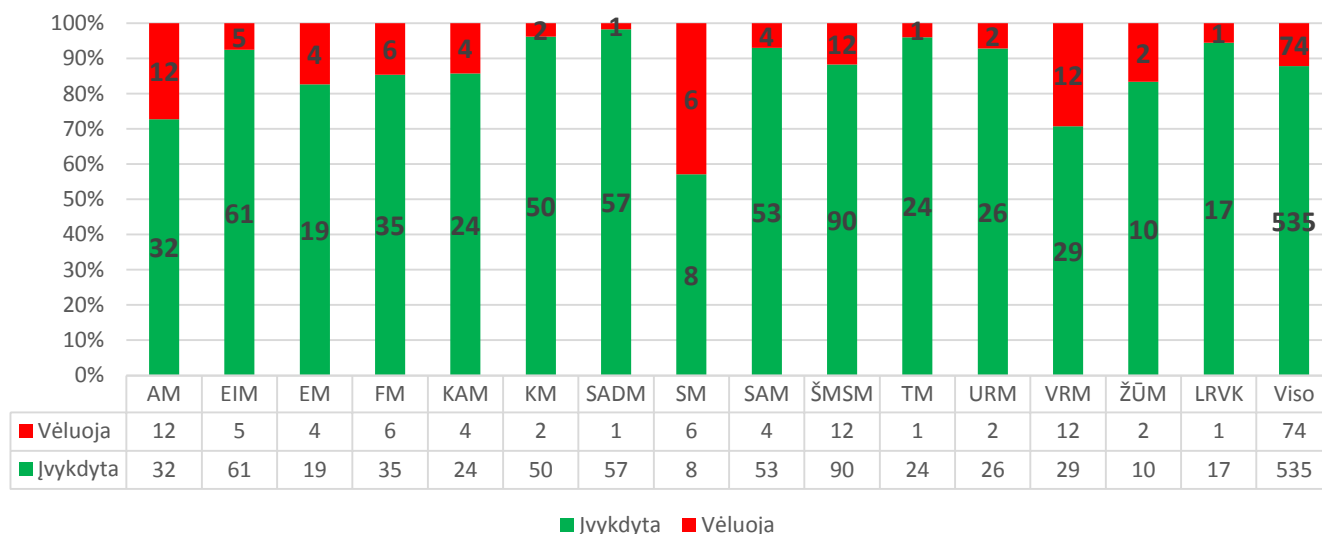

Daugiausiai veiksmų vėluoja įvykdyti: AM, ŠMSM ir VRM (po 12), FM ir SM (po 6), EIM (5), EM, KAM ir SAM (po 4).

4. Derinimas. Ataskaitos projektas parengtas pagal institucijų į Stebėsenos informacinę sistemą suvestus duomenis (iki 2020 m. liepos 15 d.). Projektas derintas su Vyriausybės kanceliarijos ir Ministro Pirmininko patarėjais, pataisytas pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

5. Atitiktis Vyriausybės programai. Informacija apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymą parodo Vyriausybės programos įgyvendinimo pažangą.

6. Dalykinio vertinimo išvada. Ministerijos, atsiskaitydamos už laiku neįvykdytus LRV plano veiksmus, nurodė įvairias vėlavimo priežastis, iš kurių pagrindinės yra šios:

- 1) užtrunka teisės akto projekto parengimas ir jo derinimas;
- 2) Vyriausybė ar Seimas gražina patobulinti teisės aktų projektus;
- 3) nepavyksta institucijoms sutarti dėl esminių nuostatų ir reikalingų pokyčių;
- 4) veiksmai tik iš dalies įvykdyti, nes Seimas dar nesvarstė arba nepriėmė Vyriausybės pateiktų įstatymų projektų.

Siūlome klausimą svarstyti ministrų pasitarime.

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės patarėja

Jurgita Deveikytė

Jurgita Deveikytė, tel. 8 706 63842, el. p. jurgita.deveikyte@lrv.lt
